

การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของงบประมาณปี พ.ศ.2563 ที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.2564




% ผลการดำเนินงาน

81%


% ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด

51 %

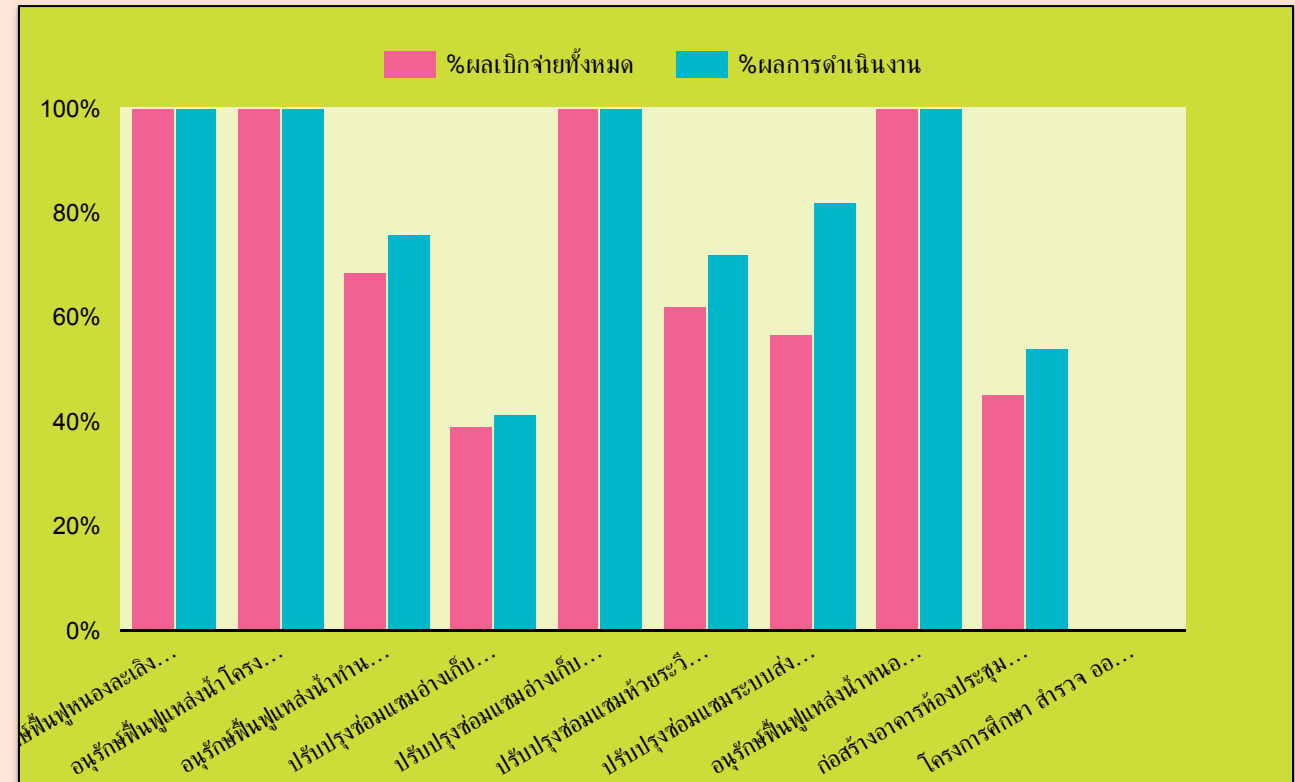

พื้นที่โครงการ ▾	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบใน...	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. อนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. อนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำหนองพลวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. อนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำท่านบเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...	ทำหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
5. อนุรักษ์พื้นที่หนองละเลิง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช...	ลดต้นทุน 4,734.96 บาท
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโครงการไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	หยุดงาน เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน สด.1 กำลังให้ทางพื้นที่ดำเนินการไกล...
7. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงมะค่า	ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว
8. ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำ	ส่งหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 4 / งานล่าช้าเนื่องจากคนงานมีจำนวนน้อย
9. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหลักใหญ่	แจ้งเตือนการปรับ/หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.63
10. ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจุได้จำนวน 100 คน	ส่งหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 4 / สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

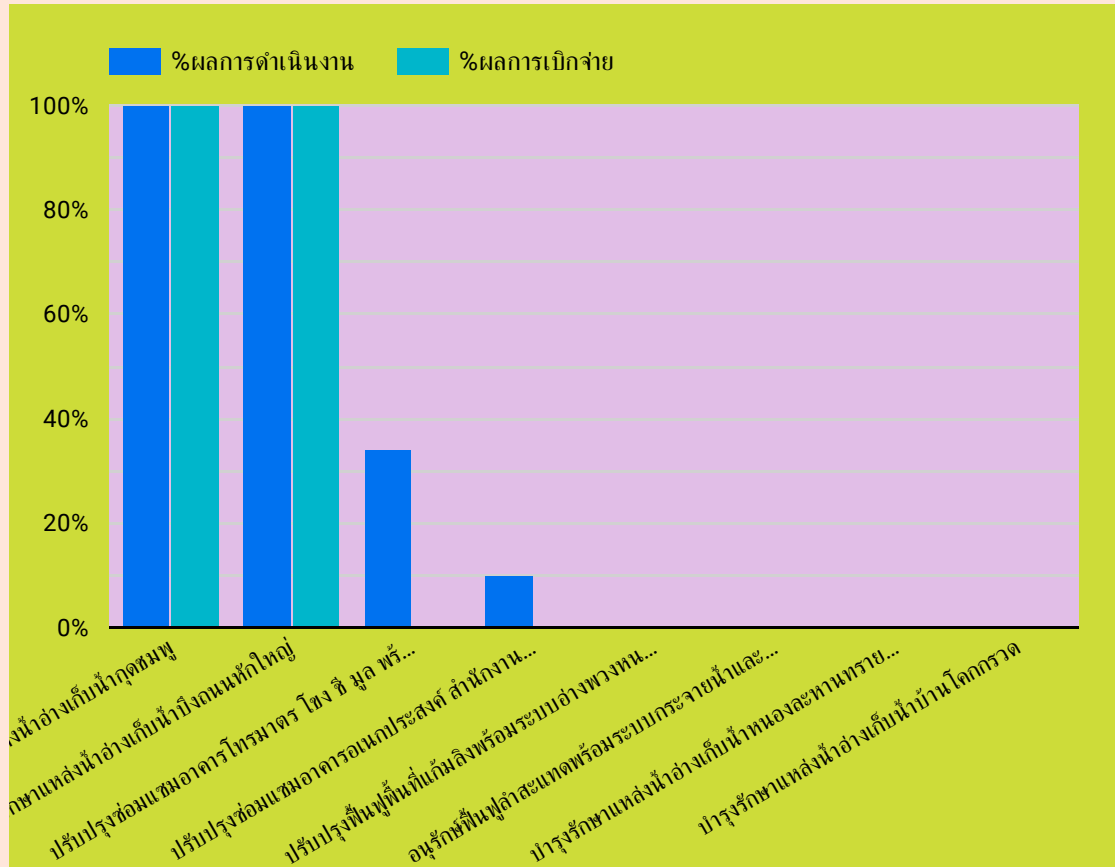

% ผลการดำเนินงาน

2.2 %

% ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด

0.0071 %



พื้นที่โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค
1. ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองโน	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะเทตพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโทรมาตร โสง ชี มูล พร้อมก่อสร้างโรงจอตระยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
5. บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชุมพู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	ลดต้นทุน 8,400 บาท
7. บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองละหานทรายเก่า	กำลังดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่
8. บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด	กำลังดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รายงานการดำเนินการแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง


% ผลการดำเนินงาน

24.77%



% ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด

11.72 %

ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)

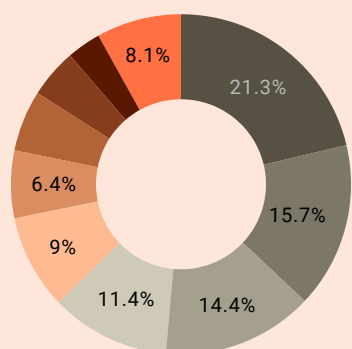

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

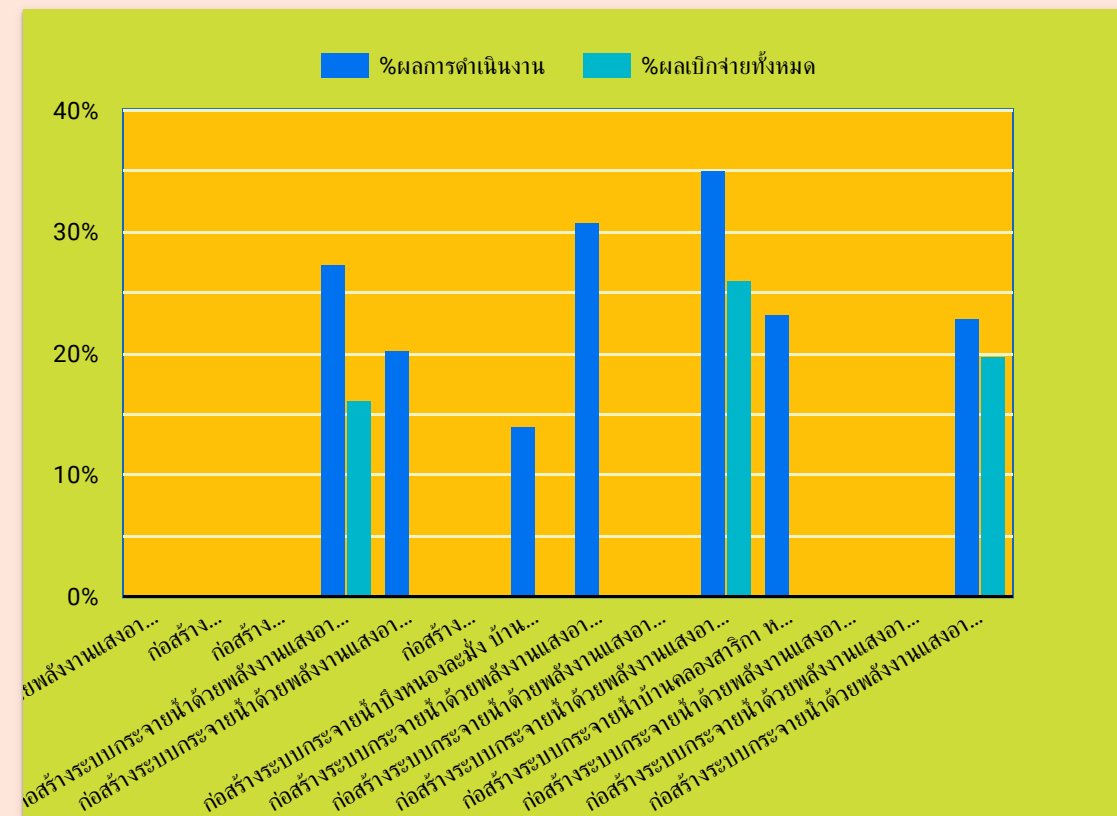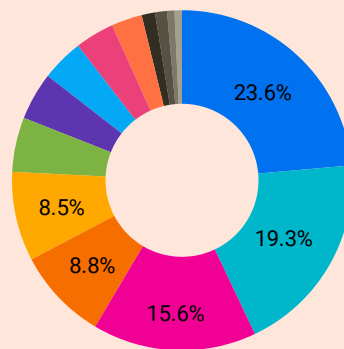

พื้นที่โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	พื้นที่รับประโยชน์ ...	ครัวเรือนได้รับประโยชน์...
1. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองชาด หมู่ที่ 11	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ขายแบบ จะเสนอราคารในวันที่ 3 ก.พ. 64) คาดว่า...	2,500	62
2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลองสาริกา หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างการดำเนินงานฐานราก	75	73
3. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบึงหนองมะม่วง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6	โครงสร้างงานก่อสร้างฐานรากหลอင့်สูงและฐานรากรับแผงเซลล์พลังงานแสงอ...	75	271
4. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	550	68
5. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทำห้วยอ้อ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	310	734
6. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างหนองไฟ บ้านหนองไฟ หมู่ที่ 7	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	1,650	300
7. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยท่าบ	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	930	151
8. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงปรือแวง บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	900	672
9. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหอยกบบ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะเห็นสัญญา เดือนมีนาคม 2564	2,050	994
1... ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างการตกแต่งเสริม	425	218
